


CONSEIL MUNICIPAL DE RUELLE-SUR-TOUVRE


10 AVRIL 2017




INTRODUCTION

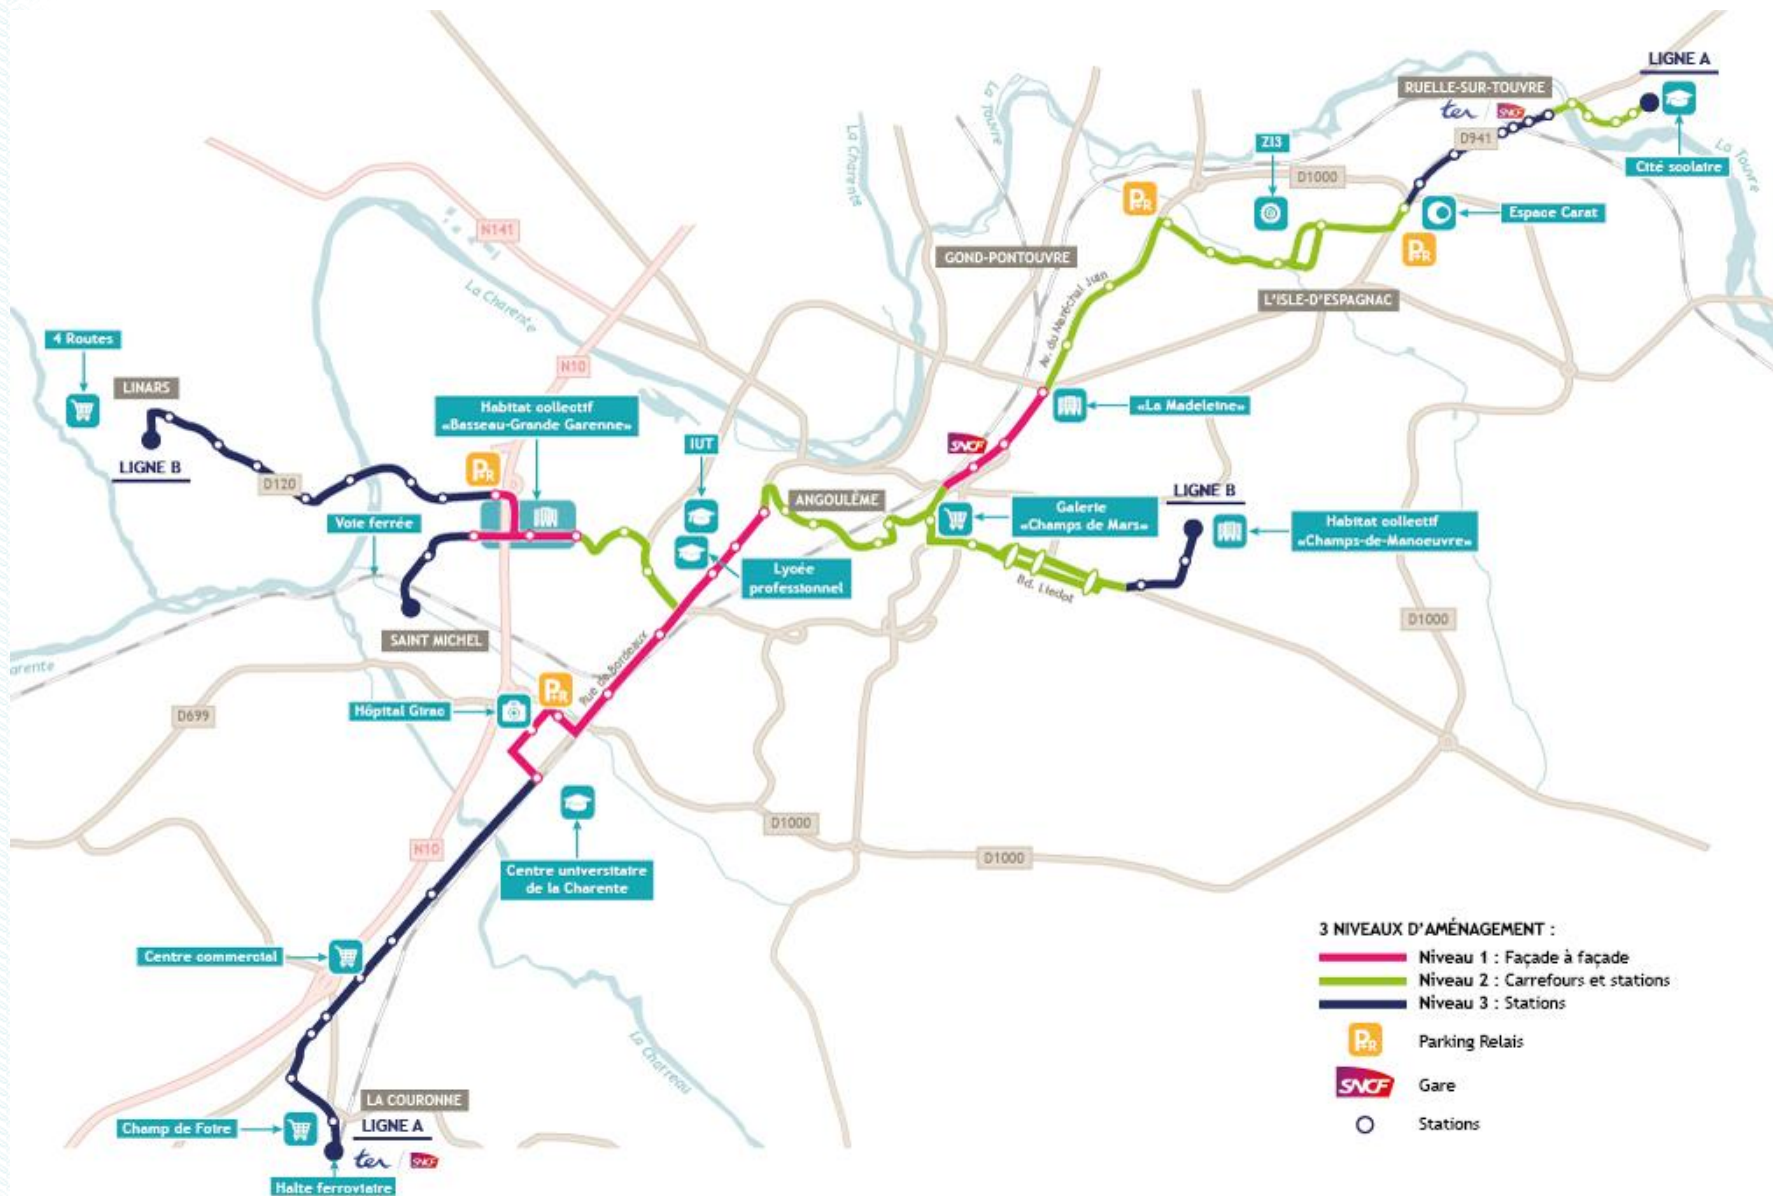

PLANNING DU PROJET

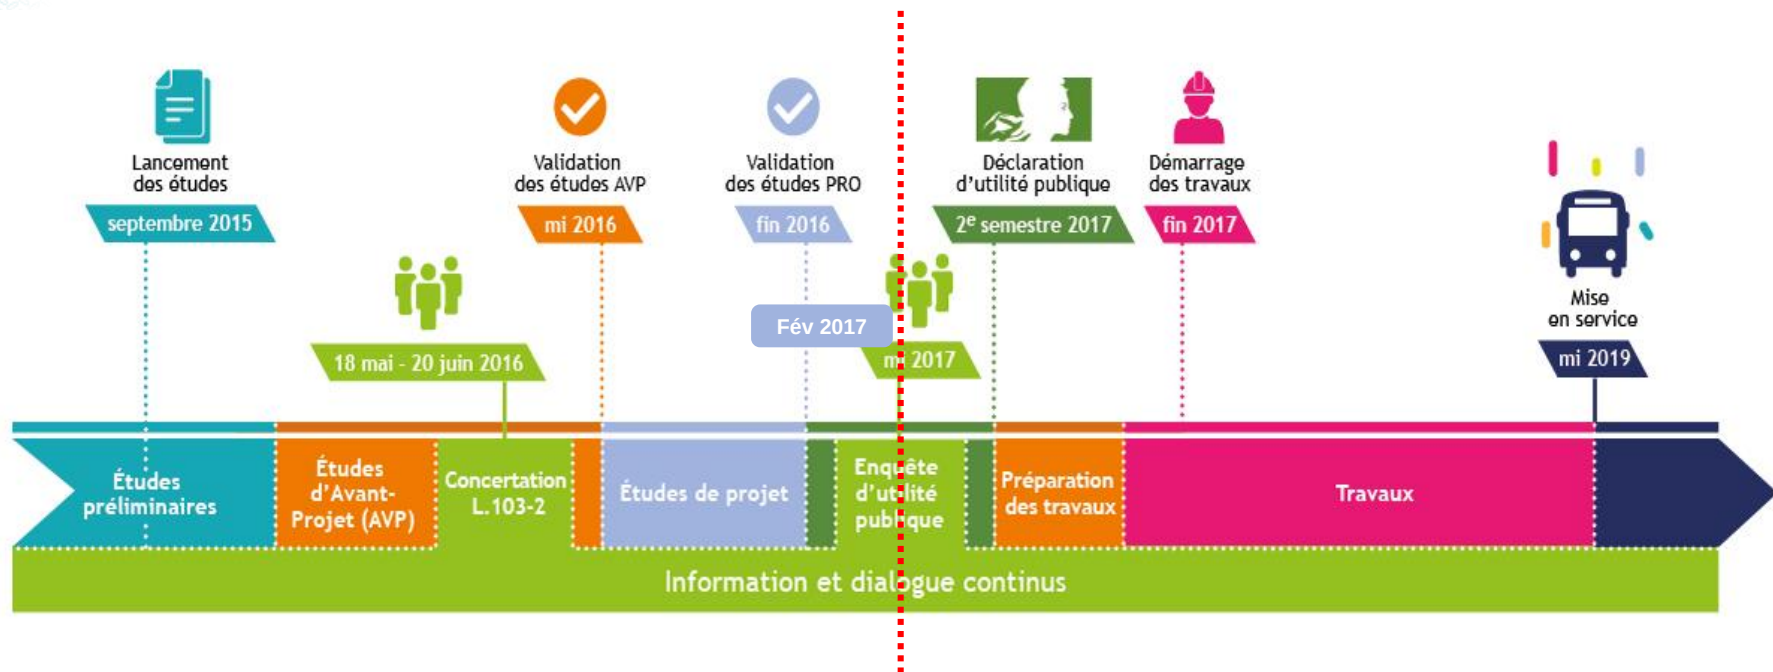

1 – La desserte de Ruelle-sur-Touvre



1 – LA DESSERTE DE RUELLE-SUR-TOUVRE




2 – Les aménagements sur la Commune



STATIONS JEAN ANTOINE & OASIS

Station
JEAN-ANTOINE


Réalisation septembre / octobre 2018

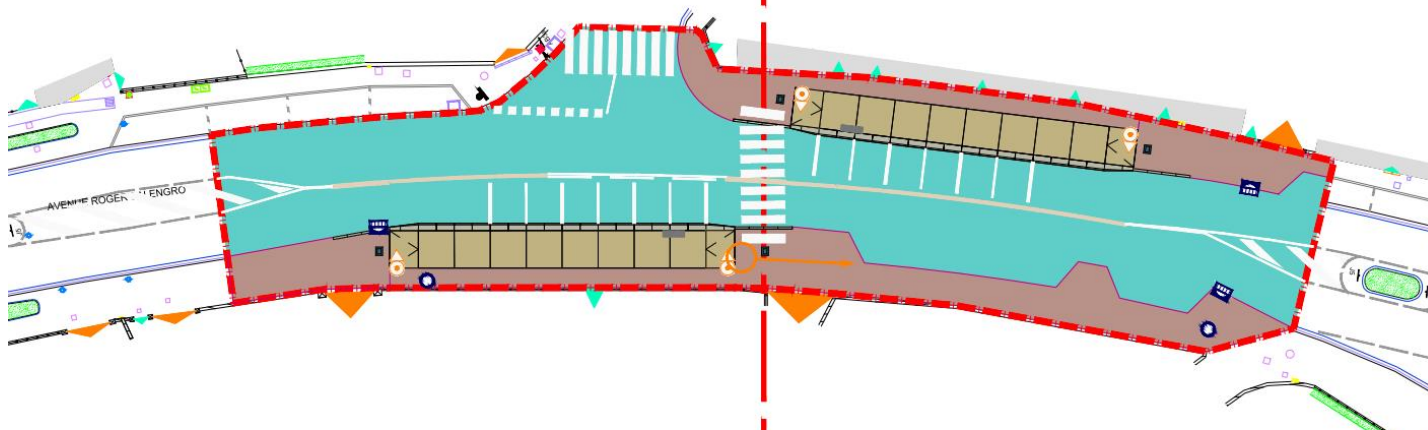



Tranche optionnelle

Station
OASIS

Réalisation mi-octobre
jusqu'à mi décembre 2018

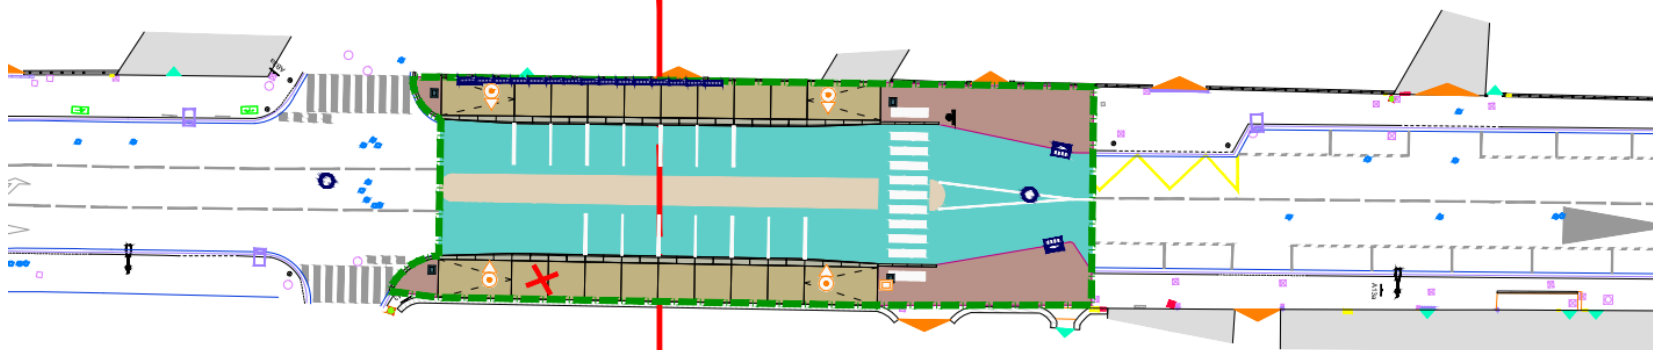


STATIONS PN RUELLE & FONDERIE

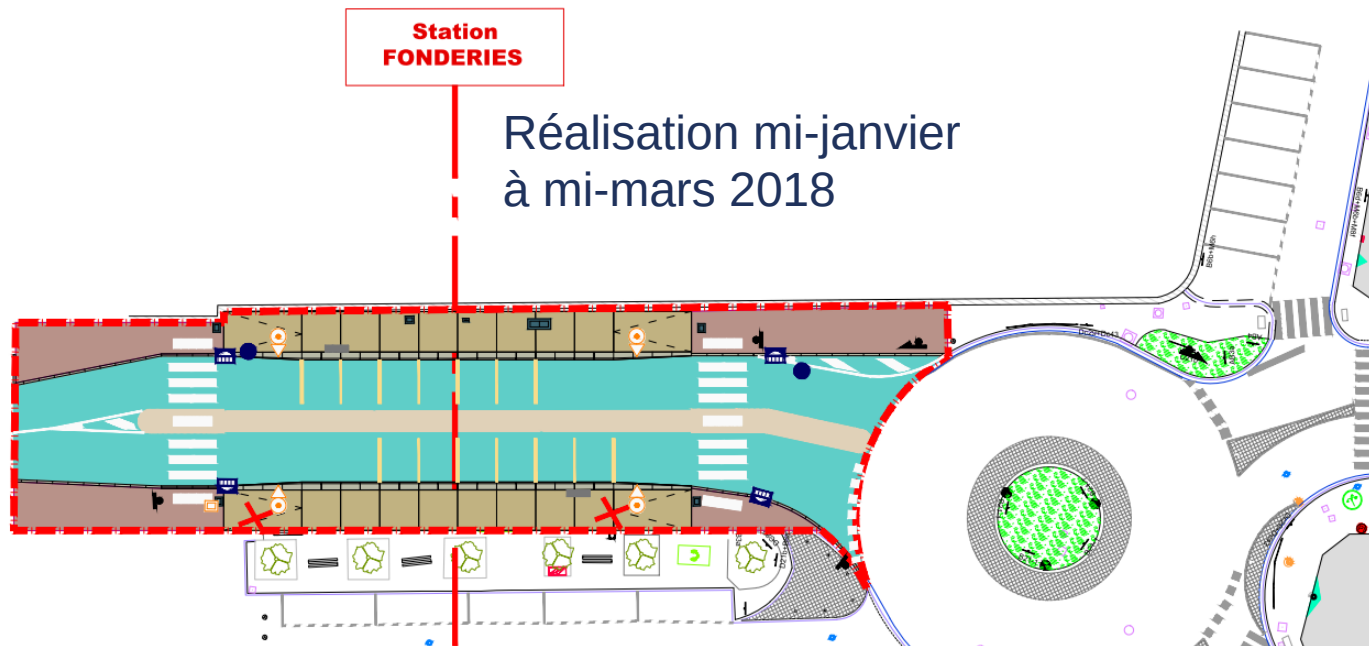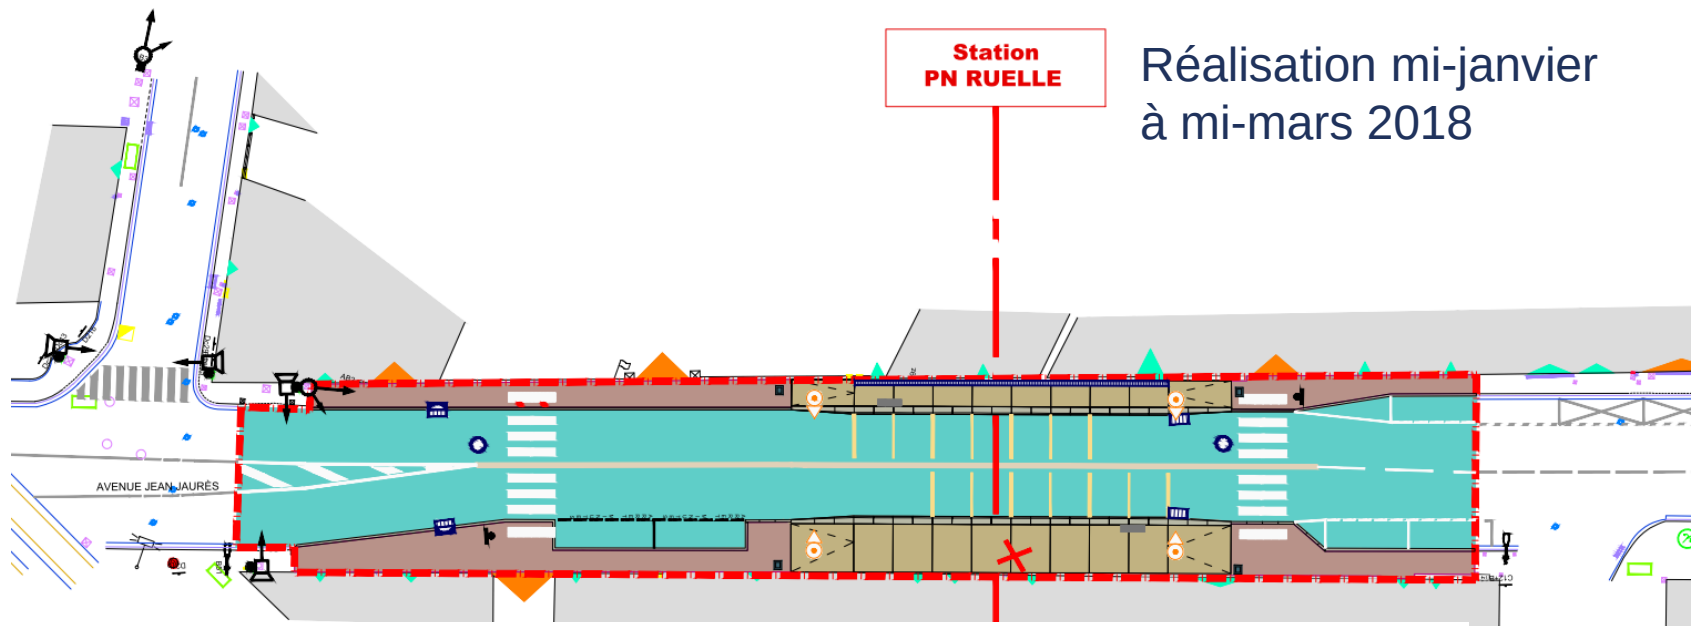


STATION WILSON & CARREFOUR CIMETIÈRE

Wilson N : réalisation mi-février à mars 2018

Wilson S : réalisation juin à mi-juillet 2018

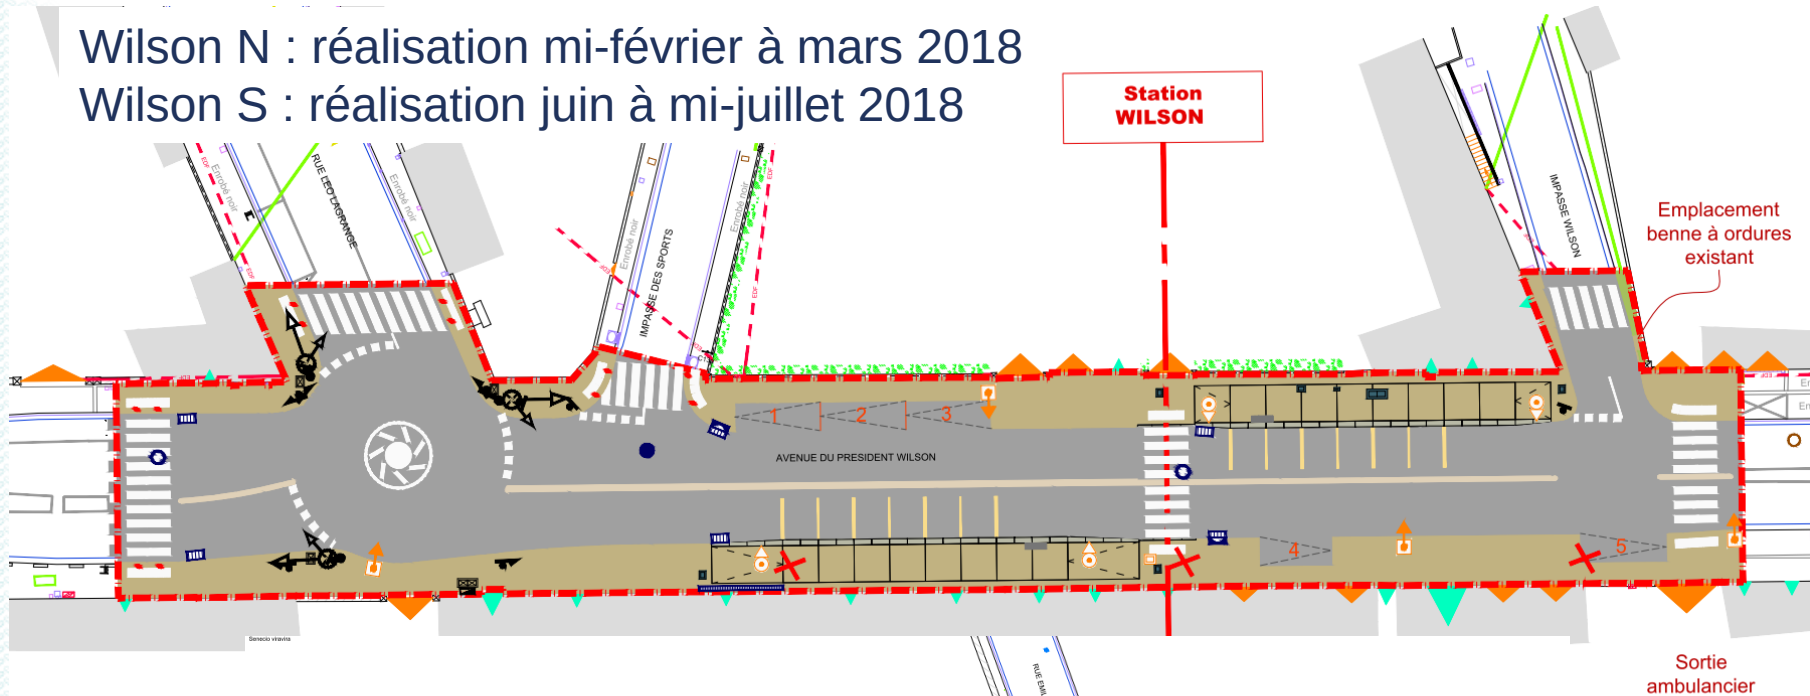


Carrefours : réalisation juillet – août 2018

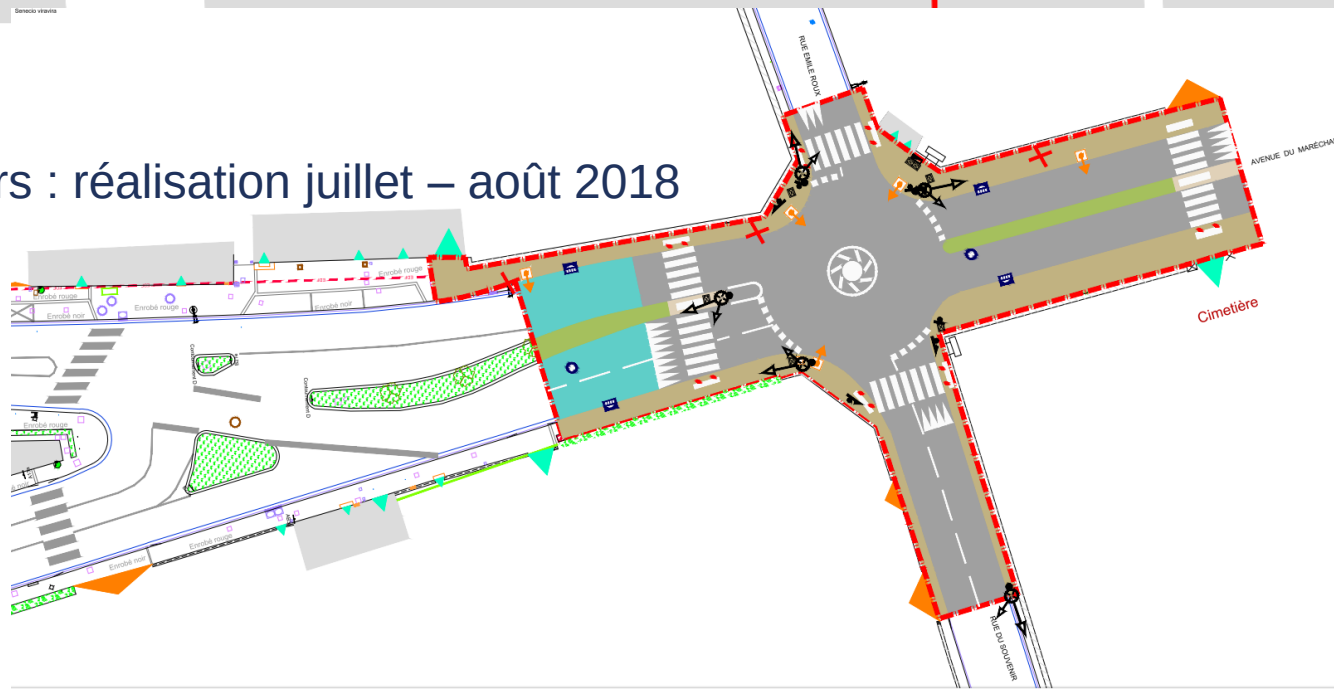

STATIONS LES ORMEAUX & MME CURIE


Réalisation juillet – août 2018

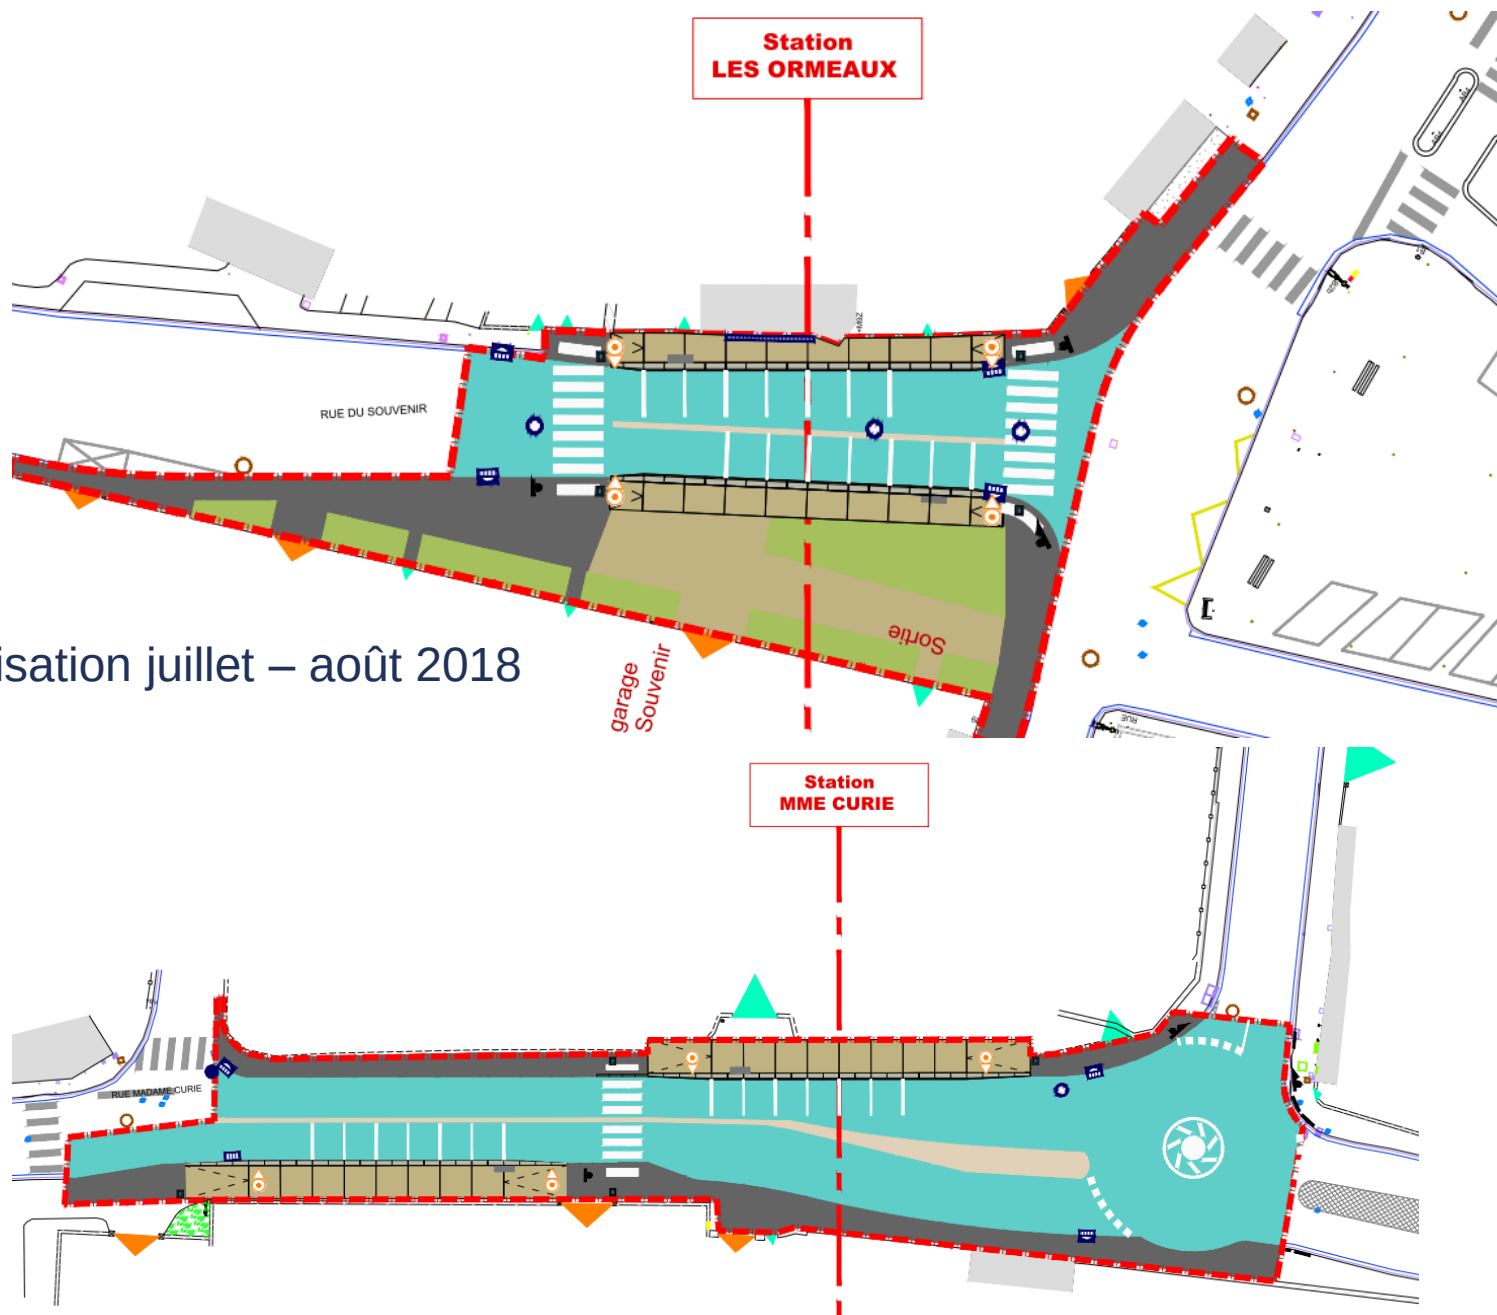


STATION LANGEVIN

Station
LANGEVIN

Réalisation septembre octobre 2018

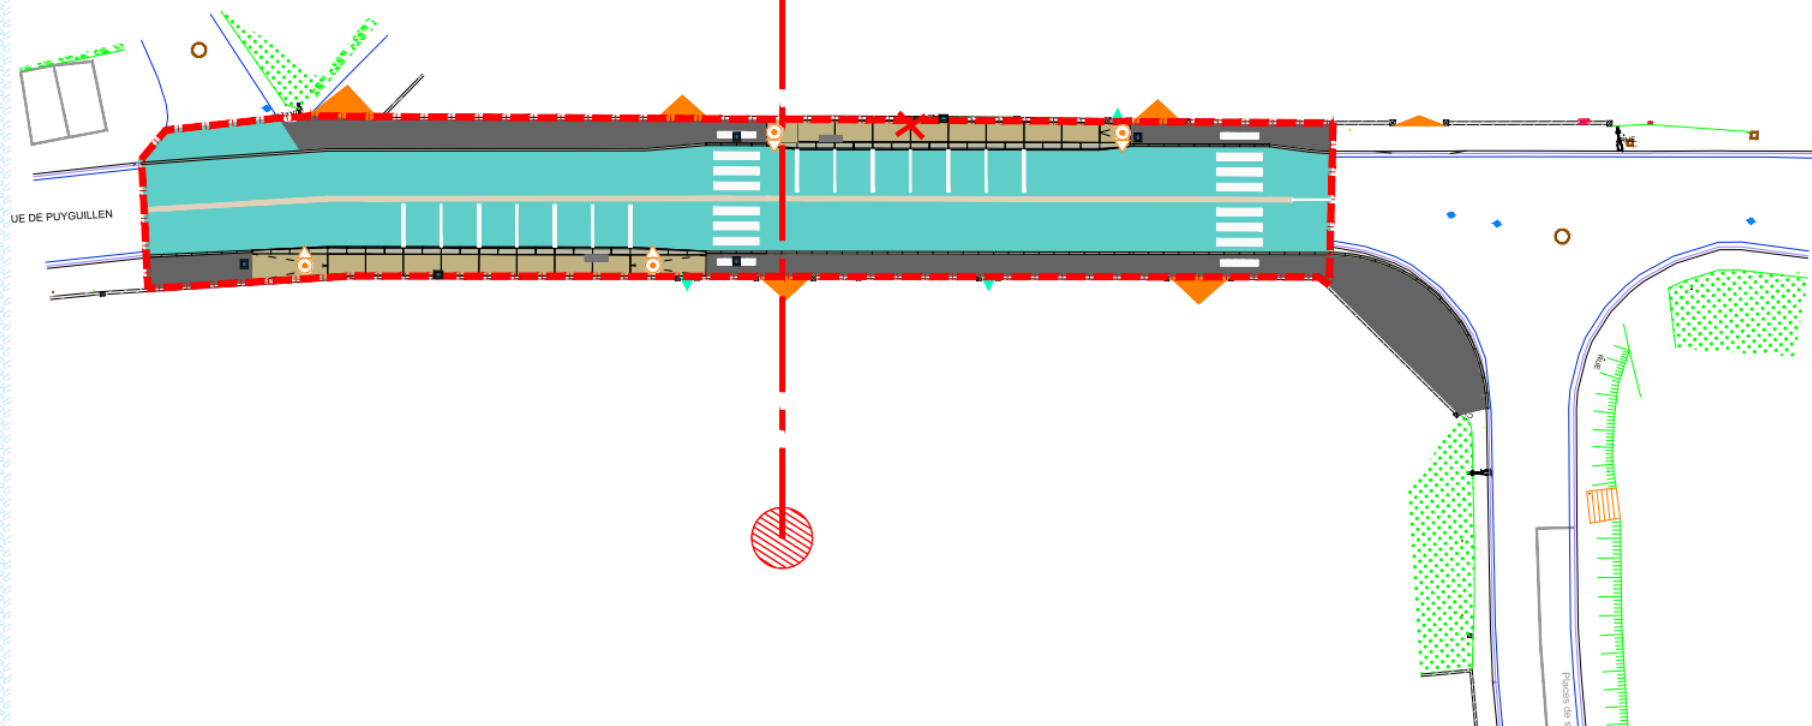

TERMINUS CITÉ SCOLAIRE

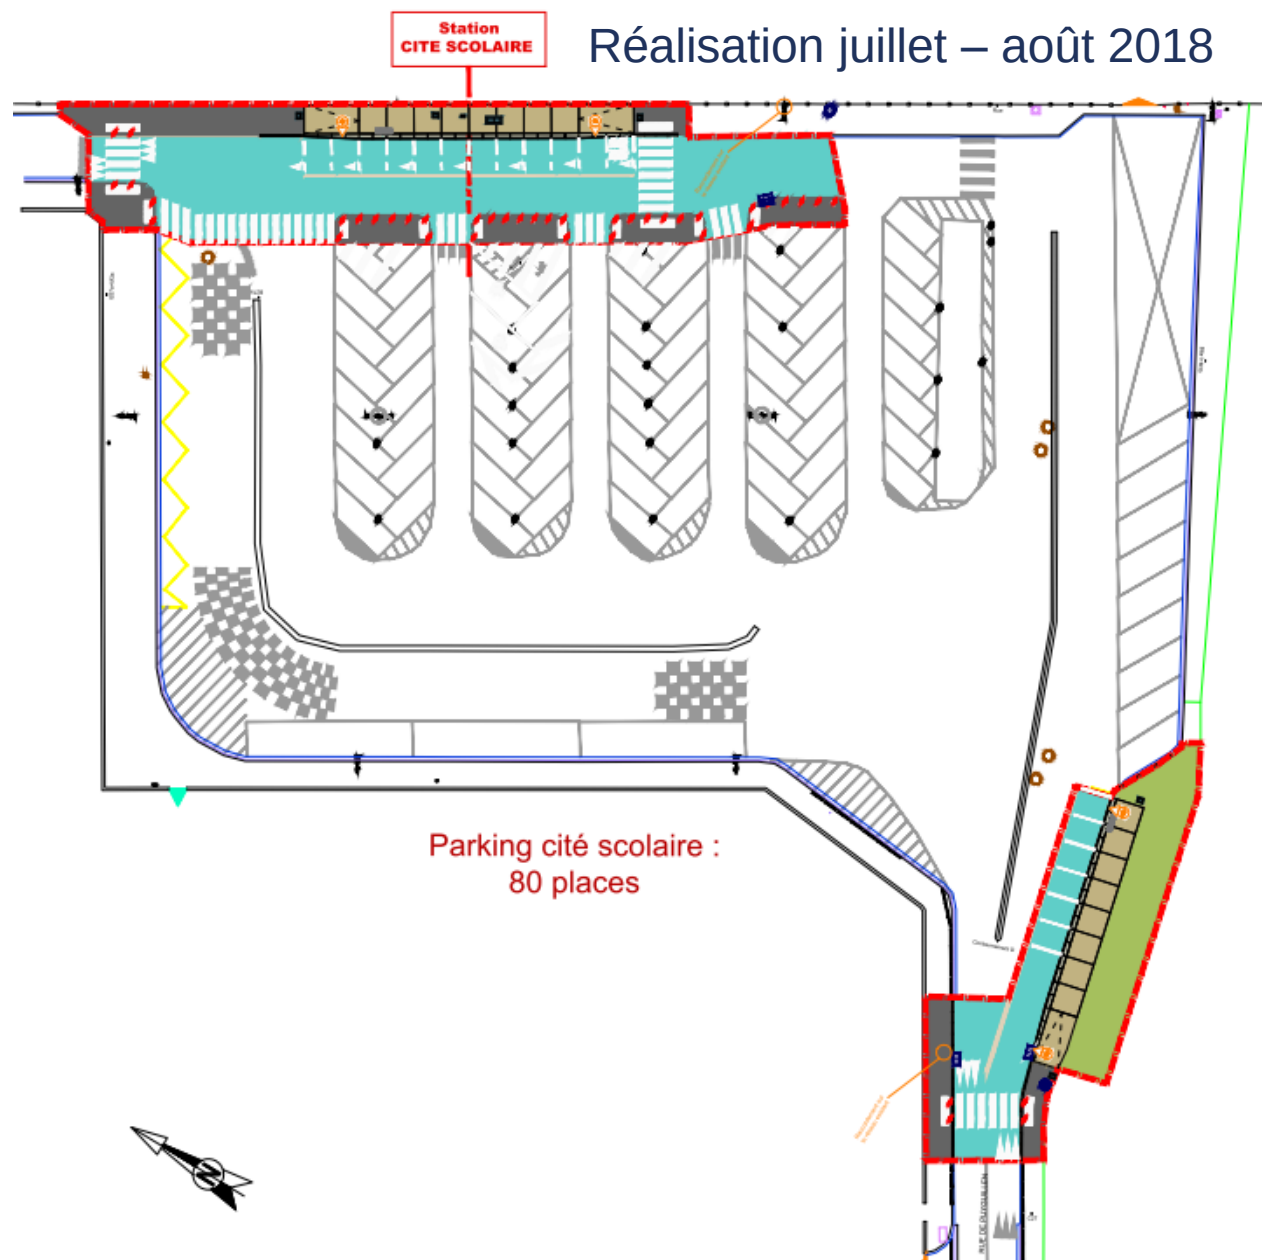

3 – Planning prévisionnel des travaux



PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX BHNS - secteur de Ruelle-sur-Touvre

Secteur 14/ Ruelle-sur-Touvre	août-17	sept-17	oct-17	nov-17	déc-17	janv-18	févr-18	mars-18	avr-18	mai-18	juin-18	juil-18	août-18	sept-18	oct-18	nov-18	déc-18	janv-19	févr-19	mars-19	avr-19	mai-19	juin-19
Construction DCNS																							
Travaux concessionnaires																							
SLT																							
St. Jean Antoine																							
St. Oasis																							
St. PN Ruelle																							
St. Fonderie																							
St Wilson quai NORD																							
St Wilson quai SUD																							
Carrefour Wilson/Souvenir 1/2 NORD																							
Carrefour Wilson/Souvenir 1/2 SUD																							
St. Les Ormeaux																							
St. Mme Curie																							
St. Langevin																							
St. Cité scolaire																							

Planning en cours de mise à jour en fonction des contraintes de coordination

- Manifestation sur le commune
- Travaux DCN
- Prise en compte des journées sans chantier imposées par la DIRA



MERCI
de votre attention
